



BackIO

Geeks Ecuador · Sistema operativo de backlog

Manual de uso

Cómo se gestiona una cuenta de principio a fin: del pedido del cliente al to-do en Basecamp, y de ahí al weekly, los indicadores y el informe mensual.

Para quién es este manual


Ejecutivas de cuenta, operaciones (Marcia), líderes de mesa, equipo de producción y administración.
Cada sección dice a qué rol le toca y qué botón pulsar.

Contenido

- 1** Qué es BackIO y cómo encaja con PrometIO y Basecamp
- 2** Las cinco reglas que nunca se rompen
- 3** Entrar por primera vez, roles y permisos
- 4** Recorrido por la pantalla
- 5** Dashboard
- 6** Backlog: la tabla del día a día
- 7** Reprogramar una entrega (con motivo)
- 8** Reprocesos: cuando un entregable vuelve
- 9** Proyectos
- 10** Crear un proyecto: el Builder en 5 pasos
- 11** Fees mensuales: recurrencia automática
- 12** Daily: apertura y cierre de mesa
- 13** Weekly: señales, acuerdos, plan y acta
- 14** Huérfanos: tareas creadas fuera de BackIO
- 15** Informes mensuales
- 16** Portal del cliente
- 17** Basecamp: qué entra, qué sale, qué nunca
- 18** PrometIO: de la cotización al proyecto
- 19** La capa de IA: qué redacta y quién publica
- 20** Administración
- 21** Agentes: MCP y API
- 22** Indicadores y definiciones
- 23** Rutinas recomendadas por rol
- 24** Problemas frecuentes

Qué es BackIO y cómo encaja

BackIO es la capa de gestión de cuenta y backlog operativo de Geeks. Reemplaza a Monday como tablero de requerimientos y como cara hacia el cliente, y se apoya en Basecamp como sistema de ejecución del equipo. No sustituye a Basecamp: lo organiza.



PrometIO	CRM comercial. Cuando una cotización se aprueba, la empresa aparece como cliente en BackIO y la cotización como borrador de proyecto.
BackIO	Dónde se decide qué se hace, para quién, cuándo y quién lo lleva. Dónde viven el daily, el weekly, las señales, los indicadores y el portal del cliente.
Basecamp	Dónde el equipo produce: cada proyecto de BackIO es una lista de to-dos en el proyecto Basecamp del cliente; cada bloque es un grupo; cada requerimiento es un to-do. Los comentarios y archivos se quedan en Basecamp.
Mesas	Orión y Omega. Cada cliente pertenece a una mesa. El daily, el weekly y el informe mensual se publican en el proyecto Basecamp de la mesa.

La regla de oro del flujo

Todo trabajo nuevo entra por BackIO: **cliente** → **ejecutiva** → **BackIO** → **Basecamp**. Si alguien crea un to-do a mano en Basecamp, BackIO lo detecta como "huérfano" y avisa. La meta es que esa lista esté siempre en cero.

Las cinco reglas que nunca se rompen

- 1 El texto de Basecamp jamás entra a BackIO.** BackIO solo sincroniza si un to-do está completado, cuándo, su fecha y sus asignados. Nunca comentarios, descripciones ni adjuntos. Es la garantía de que un comentario interno no pueda llegar al cliente por ningún camino.
- 2 La visibilidad se hereda, no se decide.** Qué ve el cliente viene de la plantilla. Una persona puede ocultar algo que era visible, nunca mostrar algo que estaba oculto. Lo impide la base de datos, no la pantalla.
- 3 Los estados no se sincronizan en dos direcciones.** Basecamp manda sobre "completado". BackIO manda sobre todo lo demás: estado operativo, aprobación, prioridad, peso. Por eso una tarea enlazada a Basecamp no se puede marcar completada desde BackIO: se marca allá.
- 4 Toda escritura de un agente de IA requiere vista previa y confirmación.** Un agente propone un plan; una persona lo confirma. Nunca ejecuta directo.
- 5 Cada dato pertenece a un tenant.** Hoy solo existe Geeks, pero la base ya está preparada para separar agencias sin reescribir nada.

Excepción acotada (aprobada el 04/09/2026)

Al importar lo que ya existía en Basecamp, entra el **título** del to-do como título interno, siempre oculto al cliente. Un título es el nombre de una tarea, no una conversación. Descripciones y comentarios siguen fuera.

Entrar por primera vez, roles y permisos

Recibir la invitación

- 1 Un administrador te invita desde **Admin** → **Usuarios** con tu correo y tu rol.
- 2 Te llega un correo de BackIO <no-reply@crm.geeks.com.ec> con el botón para definir tu contraseña. El enlace vence en 24 horas; si venció, pide que te lo reenvíen ("reenviar" junto a tu invitación).
- 3 Defines la contraseña (mínimo 8 caracteres) y entras directo al backlog.

Un correo @geeks.com.ec sin invitación previa también puede entrar, pero lo hace como colaborador. Para tener otro rol hace falta la invitación.

Roles

Rol	Quién	Puede	No puede
admin	Luis	Todo, incluida la sección Admin	—
operaciones	Marcia	Todo lo operativo: backlog, proyectos, weekly, daily, informes, publicar en Basecamp	Admin (clientes, mesas, plantillas, usuarios, API keys)
ejecutiva lider gerencia	Cuentas, líderes de mesa, gerencia	Lo mismo que operaciones	Admin
colaborador	Equipo de producción	Ver todo el backlog, proyectos, daily y weekly. En sus tareas: cambiar estado, fecha de entrega (con motivo), entregables, registrar y cerrar reprocesos	Crear proyectos, generar o publicar documentos, editar tareas ajenas, título, prioridad, responsables, visibilidad

Tu rol aparece junto a tu correo al pie del panel lateral. Los botones que no te corresponden no se muestran, y el servidor rechaza la acción aunque alguien la fuerce.

Recorrido por la pantalla

El panel lateral izquierdo se puede plegar con «. Cuando está plegado quedan solo los iconos.

Sección	Para qué	Quién la usa a diario
Dashboard	Salud de la operación: KPIs, clientes, personas, últimas 8 semanas, arrastre	Operaciones, gerencia, líderes
Backlog	Todos los requerimientos, editables en línea. Tabla estilo Monday o Kanban	Todos
Proyectos	Lista y detalle de proyectos, portal del cliente, avance	Ejecutivas, operaciones
Daily	Las tres señales del día y la publicación de apertura y cierre	Quien lleva la mesa
Weekly	Señales, acuerdos, plan operativo, acta de cierre, causas pendientes	Marcia
Huérfanos	To-dos creados a mano en Basecamp	Operaciones
Informes	Informe ejecutivo mensual por mesa	Marcia, gerencia
Admin	Clientes, mesas, plantillas, recurrencias, tipos de pieza, usuarios, integraciones, API keys	Solo admin


Botones y colores

Azul acción principal · **Verde** confirmar o publicar apertura · **Rojo** publicar cierre o acciones delicadas · **Gris** acciones secundarias · ✨ lo redacta la IA y tú lo revisas antes de publicar.

CAPÍTULO 5

Dashboard

Se puede ver toda la agencia o una mesa. Todo lo que muestra sale de los datos del backlog y de las horas de Basecamp; no hay nada cargado a mano.

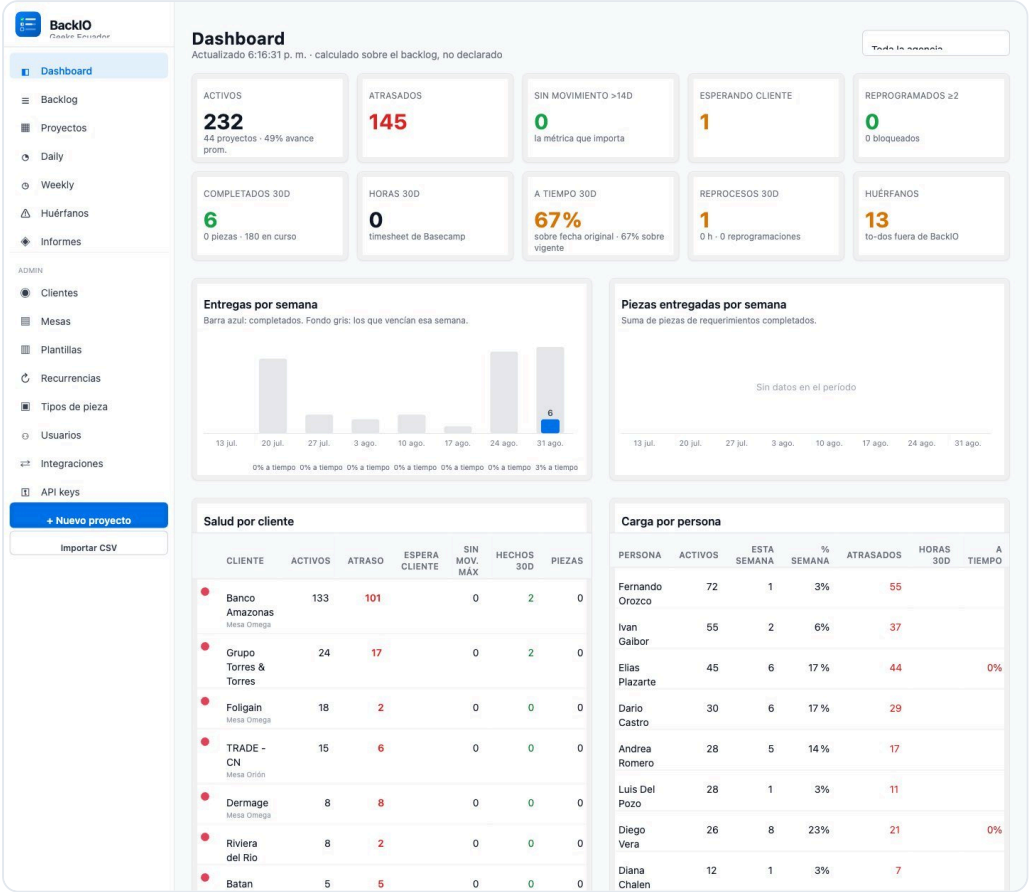

Dashboard: KPIs, entregas por semana y salud por cliente.

KPIs de arriba

KPI	Qué mide
Activos / Atrasados	Requerimientos no completados; atrasados = fecha de entrega ya pasó
Sin movimiento 14d	Tareas que nadie tocó en dos semanas. Es la columna que más importa: detecta tableros muertos
Esperando cliente / Bloqueados	Con aprobación "Pendiente cliente" / con estado "Bloqueado"
Completados 30d	Entregas del último mes, con piezas
Horas 30d	Horas registradas en el timesheet de Basecamp
A tiempo 30d	Porcentaje entregado antes de la fecha original comprometida. Debajo, el porcentaje sobre la fecha vigente
Reprocesos 30d	Entregables que volvieron al equipo, con las horas que costaron


Huérfanos	To-dos creados fuera de BackIO pendientes de adoptar
-----------	--

Salud por cliente

Cada cliente aparece en verde, amarillo o rojo. Rojo: más de 2 atrasados, o más de 14 días sin movimiento, o algo con más de 30 días de atraso. Amarillo: algún atraso o más de 7 días sin movimiento. Además: horas del mes, valor cotizado activo y la relación USD por hora, porcentaje a tiempo y reprocesos.

Carga por persona

Tareas activas, cuántas vencen esta semana y qué porcentaje del total de la semana carga cada persona, atrasados, horas, porcentaje a tiempo sobre fecha original, desvío mediano en días, reprogramaciones atribuibles al equipo y reprocesos. Al pasar el cursor por las dos últimas columnas se ve la causa dominante.

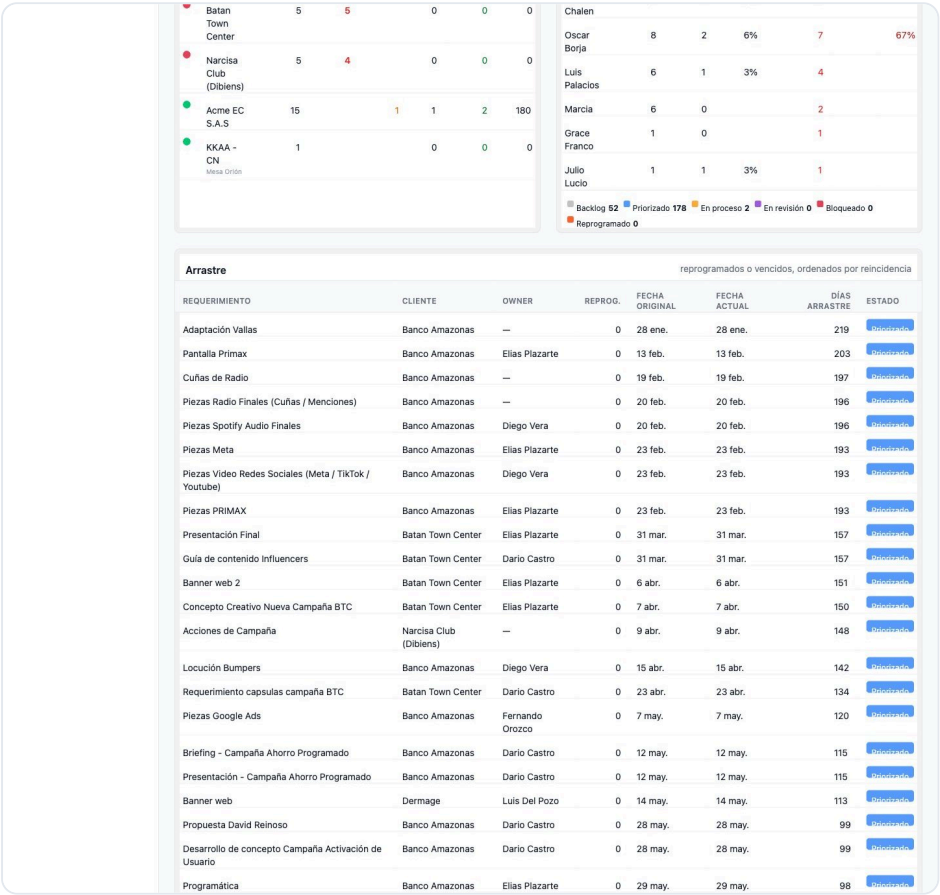

Carga por persona y lista de arrastre, ordenada por reincidencia.

Arrastre

Tareas reprogramadas o atrasadas, ordenadas por veces reprogramadas y días acumulados desde la fecha original. Es la lista que se discute en el weekly.

Backlog: la tabla del día a día

Todos los requerimientos activos, agrupados por cliente, con edición en línea: haces clic en una celda, cambias y se guarda solo. Arriba a la derecha se alterna entre **Tabla** y **Kanban** (columnas por estado; arrastrar una tarjeta cambia el estado).

Backlog

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

Nuevo proyecto

Importar CSV

Backlogpriorizado

232 requerimientos - sin movimiento es la columna que importa

TablaKanbanNuevo proyecto

232 de 232

Buscar, filtrar y ordenarFecha de entrega

Acme EC S.A.S15 requerimientos

Requerimiento	Proyecto	Owner agencia	Fecha pedido	Fecha entrega	Prioridad	Estado	Aprobación
Calendario de contenidos	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-04	Alta	Revisión	Revisión interna
Brief y especificaciones de ca	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-04	Alta	Revisión	Revisión interna
Aprobación interna de calend	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-06	Media	Revisión	Sin estado
Propuesta de diseño PO	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-09	Media	Revisión	Revisión interna
Revisión de DA	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-10	Media	Revisión	Revisión interna
Copias del mes	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-12	Media	Revisión	Revisión interna
Artes finales por formato	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-15	Media	Revisión	Revisión interna
Revisión de DA	Proyectos de marketing		2026-09-10	2026-09-16	Media	Revisión	Revisión interna
Control de calidad de impresi	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-16	Media	Revisión	Sin estado
Entrega	Proyectos de marketing		2026-09-10	2026-09-17	Media	Revisión	Sin estado
Diseño de piezas	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-18	Media	Revisión	Revisión interna
Entrega a imprenta / cader	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-18	Media	Revisión	Sin estado
Revisión de DA	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-20	Media	Revisión	Sin estado
Programación en plataform	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-09-25	Media	Revisión	Sin estado
Reporte mensual	Proyectos de marketing		2026-09-04	2026-10-02	Media	Revisión	Sin estado

Banco Amazonas133 requerimientos

Requerimiento	Proyecto	Owner agencia	Fecha pedido	Fecha entrega	Prioridad	Estado	Aprobación
Adaptación Vallas	Proyectos de marketing		2026-01-28	2026-01-28	Media	Revisión	Sin estado
Pantalla Primax	Proyectos de marketing		2026-02-13	2026-02-13	Media	Revisión	Sin estado
Cuñas de Radio	Proyectos de marketing		2026-02-18	2026-02-19	Media	Revisión	Sin estado
Piezas Radio Finales (Cuñas /	Proyectos de marketing		2026-02-19	2026-02-20	Media	Revisión	Sin estado
Piezas Spotify Audio Finales	Proyectos de marketing		2026-02-19	2026-02-20	Media	Revisión	Sin estado
Piezas Meta	Proyectos de marketing		2026-02-23	2026-02-23	Media	Revisión	Sin estado
Piezas Video Redes Sociales I	Proyectos de marketing		2026-02-23	2026-02-23	Media	Revisión	Sin estado
Piezas PRIMAX	Proyectos de marketing		2026-02-20	2026-02-23	Media	Revisión	Sin estado
Locución Bumpers	Proyectos de marketing		2026-04-15	2026-04-15	Media	Revisión	Sin estado
Piezas Google Ads	Proyectos de marketing		2026-05-08	2026-05-07	Media	Revisión	Sin estado

Backlog en vista de tabla, agrupado por cliente, con edición en línea.

Buscar, filtrar y ordenar

El panel arranca plegado. Al abrirlo: filtro por **mesa**, cliente, persona, estado, proyecto, búsqueda por texto y la casilla "Solo activos". Debajo, "Ordenar por" con doce criterios y atajos de un clic: **Más atrasados**, **Más tiempo sin mover**, **Próximos a vencer**, **Prioridad alta primero**. Aunque el panel esté cerrado, la cabecera muestra chips con lo que está aplicado y "N de M".

BackIO

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

Backlogpriorizado

232 requerimientos · sin movimiento es la columna que importa

TablaKanban+ Nuevo proyecto

• Buscar, filtrar y ordenar

Fecha de entrega ↑

232 de 232

MESA

CLIENTE

PERSONA

ESTADO

PROYECTO

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

BUSCAR

Requerimiento

Solo activos

ORDENAR POR

Fecha de entrega

↑ Ascendente

↓ Descendente

Más atrasados

Más tiempo sin mover

Próximos a vencer

Prioridad alta primero

Limpiar

Acme EC S.A.S 15 requerimientos

Requerimiento	Proyecto	Owner agencia	Fecha pedido	Fecha entrega	Prioridad	Estado	Aprobación
Calendario de contenidos	Consejeria de content		2026-09-04	2026-09-04	Alta	Pendiente	Pendiente interno
Brief y especificaciones de ca	Carline Vilave		2026-09-04	2026-09-04	Alta	En proceso	Pendiente interno
Aprobación interna de calend	Consejeria de content		2026-09-04	2026-09-06	Media	En proceso	Sin acción
Propuesta de diseño PO	Carline Vilave		2026-09-04	2026-09-09	Media	En proceso	Pendiente cliente
Revisión de DA	Carline Vilave		2026-09-04	2026-09-10	Media	En proceso	Aprobado
Copies del mes	Consejeria de content		2026-09-04	2026-09-12	Media	En proceso	Pendiente finalización
Artes finales por formato	Carline Vilave		2026-09-04	2026-09-15	Media	En proceso	Aprobado
Revisión de DA	Diana esquivel Rankin		2026-09-10	2026-09-16	Media	En proceso	Pendiente interno
Control de calidad de impresi	Carline Vilave		2026-09-04	2026-09-16	Media	En proceso	Sin acción
Entrega	Diana esquivel Rankin		2026-09-10	2026-09-17	Media	En proceso	Sin acción
Diseño de piezas	Consejeria de content		2026-09-04	2026-09-18	Media	En proceso	Pendiente finalización
Entrega a imprenta / cader	Carline Vilave		2026-09-04	2026-09-18	Media	En proceso	Sin acción
Revisión de DA	Consejeria de content		2026-09-04	2026-09-20	Media	En proceso	Sin acción

+ Agregar requerimiento

Banco Amazonas 133 requerimientos

+ Agregar requerimiento

Panel de búsqueda, filtros por mesa, cliente, persona, estado y proyecto, y barra de ordenamiento con atajos.

BackIO

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

Backlogpriorizado

232 requerimientos · sin movimiento es la columna que importa

TablaKanban+ Nuevo proyecto

• Buscar, filtrar y ordenar

Fecha de entrega ↑

232 de 232

Backlog

52

Priorizado

178

En proceso

2

En revisión

Acme EC S.A.S

Calendario de contenidos

Alta

4 sep.

Banco Amazonas

Influencers

Media

—

Grupo Torres & Torres

Post unifica la energía

Media

—

Grupo Torres & Torres

Post 4PL la nueva etapa

Media

—

Banco Amazonas

Diálogo Deportivo - Digital

Media

—

Banco Amazonas

Radio FM

Media

—

Banco Amazonas

Radio Sucre

Media

—

Banco Amazonas

Radio i99

Media

—

Banco Amazonas

Adaptación Vallias

Media

28 ene.

Banco Amazonas

Pantalla Primax

Media

13 feb.

Banco Amazonas

Cuñas de Radio

Media

19 feb.

Banco Amazonas

Piezas Radio Finales (Cuñas / Menciones)

Media

20 feb.

Banco Amazonas

Piezas Spotify Audio Finales

Media

20 feb.

Banco Amazonas

Piezas Meta

Media

23 feb.

Banco Amazonas

Piezas Video Redes Sociales (Meta / TikTok / Youtube)

Media

23 feb.

Banco Amazonas

Piezas PRIMAX

Media

23 feb.

Acme EC S.A.S

Diseño de piezas

Media

18 sep.

Banco Amazonas

HISTORIA 1 AON: RECIBE TU TARJETA

Media

—

Suelta aquí

La misma información en Kanban: arrastrar una tarjeta cambia el estado.

Columnas

Columna	Qué es y cómo se edita
Requerimiento	Título interno (clic para editar). Iconos: 👁 el cliente lo ve · ✉ redactar recordatorio al cliente (solo si espera al cliente o está bloqueado) · 📅 historial de reprogramaciones y reprocesos · 📁 ir al proyecto
Proyecto	Proyecto al que pertenece, con enlace. Al pasar el cursor se ve el bloque
Owner agencia	Responsables (avatares). Clic para asignar o quitar
Fecha pedido / Fecha entrega	Selector de fecha. Cambiar la fecha de entrega pide motivo (capítulo 7). En rojo si está vencida; 🔄N indica cuántas veces se reprogramó
Prioridad	Alta, Media, Baja
Estado	Backlog · Priorizado · En proceso · En revisión · Reprogramado · Bloqueado · Completado · Cancelado. "Completado" está deshabilitado si la tarea tiene to-do en Basecamp: se marca allá
Aprobación	Sin estado · Pendiente interno · Pendiente cliente · Aprobado · Cambios solicitados. Pasar a "Cambios solicitados" registra un reproceso del cliente
Tipo	FEE (recurrente) o Proyecto (campana)
Atraso / Sin mov.	Días de atraso sobre la fecha vigente · días desde el último cambio
Horas	Horas registradas en Basecamp para ese to-do (90 días)
Basecamp / Última act.	Enlace al to-do · hace cuánto se tocó

Al final de cada cliente, la fila + **Agregar requerimiento** crea una tarea suelta (sin proyecto) escribiendo el título y pulsando Enter. Para trabajo con estructura usa el Builder.

Si eres colaborador

Las tareas de otras personas se ven en gris y no se editan. En las tuyas puedes cambiar estado, fecha (con motivo) y entregables, y registrar reprocesos. No ves la fila de creación.

Reprogramar una entrega (con motivo)

La fecha que se compromete en la apertura de mesa **nunca se pierde**. Cada requerimiento guarda su fecha original y cuenta cuántas veces se movió. Así el indicador de cumplimiento mide contra lo prometido, no contra la última fecha.

- 1 En el backlog cambia la fecha de entrega.
- 2 Se abre un cuadro con la fecha comprometida, la actual tachada y la nueva. Elige el **motivo**. Sin motivo no se guarda.
- 3 La tarea pasa a estado "Reprogramado", la fecha nueva se envía a Basecamp y el cambio queda en el historial ↻.



Historial de una tarea (botón ↻): fecha comprometida, reprogramaciones y reprocesos.

Motivo	Se atribuye a	Efecto en indicadores
Insumos o aprobación del cliente	Cliente	No descuenta al equipo
Cambio de alcance	Cliente	No descuenta al equipo
Capacidad del equipo	Equipo	Cuenta como reprogramación del equipo
Error de estimación	Equipo	Cuenta como reprogramación del equipo
Reproceso	Equipo	Cuenta como reprogramación del equipo
Prioridad de negocio / Otro	Neutro	No se atribuye


Con 2 o más reprogramaciones la tarea sale como señal crítica "arrastre reincidente" en el weekly: se hace, se reasigna o se mata. Si una fecha se cambió por API o por un agente sin motivo, aparece en el weekly como "causa pendiente" para completarla con un clic.

Reprocesos: cuando un entregable vuelve

Un reproceso es un entregable que regresa al equipo para corrección. Se registra la **causa** y el **paso al que vuelve**, nunca el comentario.

Cómo registrarlo

- 1 En la fila del backlog pulsa  y luego la pestaña ➔ **Registrar reproceso**.
- 2 Indica quién lo pide (cliente o revisión interna), la causa, el paso al que regresa (idea, guion, copy, storyboard, diseño, grabación, edición, posteo) y si reabrir el to-do en Basecamp.
- 3 La tarea vuelve a "En proceso". Si estaba completada en Basecamp, el to-do se desmarca allá automáticamente.
- 4 Cuando se vuelve a entregar, pulsa **Entregado de nuevo** en el historial, o simplemente completa el to-do en Basecamp: el reproceso se cierra solo y guarda las horas que costó.

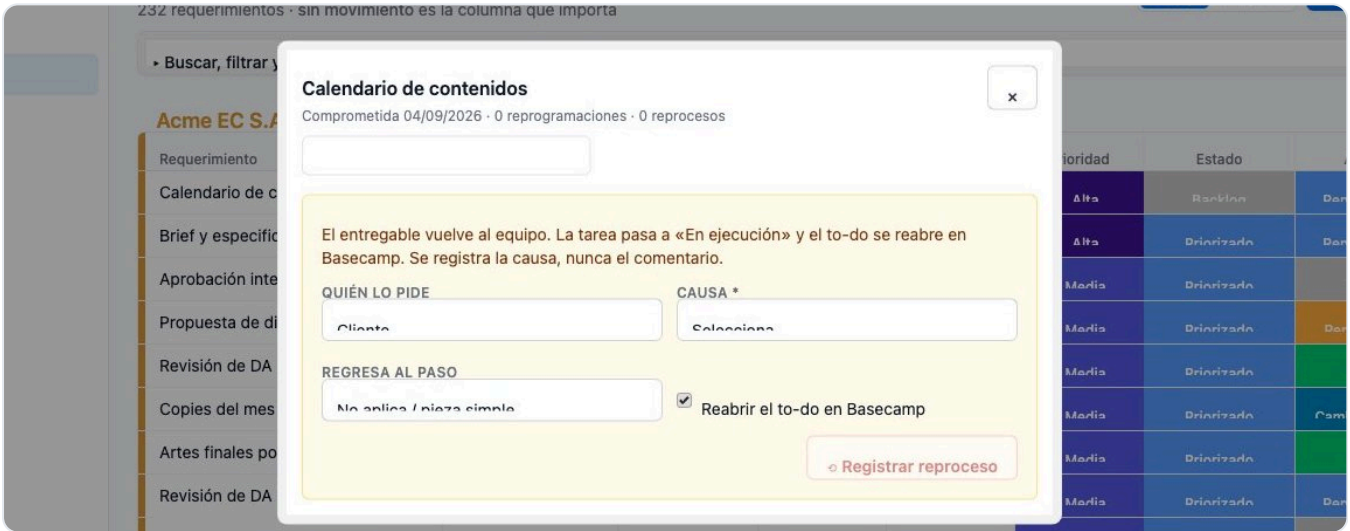

Registrar reproceso: quién lo pide, causa, paso al que regresa y reapertura en Basecamp.

También se registra sin pulsar nada: al poner la aprobación en "Cambios solicitados", al reabrir una tarea completada, o cuando alguien desmarca un to-do terminado en Basecamp (queda "sin causa" hasta que la mesa la complete).

Causa	Responsable natural
Brief incompleto o ambiguo	Ejecutiva
Error de ejecución	Equipo
Cambio de opinión del cliente	Cliente
Ajuste de marca o legal	Cliente
Dirección de arte	Líder
Error de texto	Equipo


Con 2 o más reprocesos en la misma tarea salta la señal crítica "reproceso reincidente": revisar brief y control de calidad antes de enviar.

Proyectos

Un proyecto agrupa requerimientos de un cliente con un objetivo y una fecha: un fee mensual ("Cronograma de contenido - Octubre 2026") o una campaña. En Basecamp es una lista de to-dos.

Lista

Tarjetas o lista, con búsqueda y filtros por cliente, mesa, ejecutiva, estado y portal. "Solo activos" viene marcado. Orden por entrega, inicio, avance, nombre, cliente, estado o actualización, con atajos "Próximos a entregar", "Menos avanzados", "Recién actualizados". Las entregas vencidas salen en rojo.

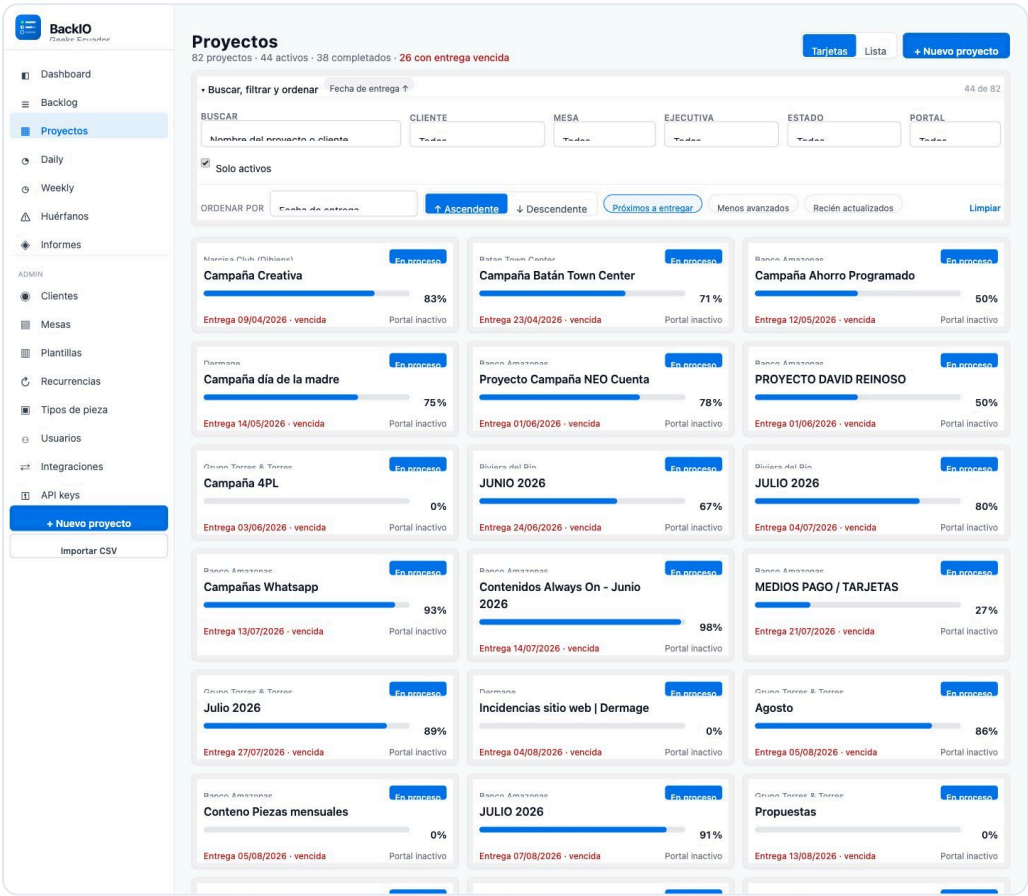

Lista de proyectos con filtros, orden y vista de tarjetas.

Detalle

- **Avance ponderado interno:** suma de pesos completados sobre pesos totales de todas las tareas (las canceladas no cuentan).
- **Vista interna:** tareas por bloque con fecha vigente, fecha original tachada si cambió, contadores ⌚ y ⚖, peso, estado y qué ve el cliente.
- **Vista cliente:** exactamente lo que verá el cliente en el portal, calculada con la misma función que el portal.
- **Controles:** activar o desactivar el portal, copiar el enlace, rotar el token, **Guardar como plantilla**, ⏮ **Repetir cada mes** (fees), **Reintentar Basecamp** si la sincronización quedó incompleta.

BackIO

Geekie Ecuador

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

hola.natalina@geekie.ec

Salir

Narcisa Club (Dibliens)

CampañaCreativa

Inicio 30/10/2025 · Entrega 09/04/2026 · En proceso

Mesa

Es del cliente

Portal cliente

Activar

Rotar token

Guardar como plantilla

AVANCE PONDERADO INTERNO (TODAS LAS TAREAS)

83%

Vista interna · 6 tareas · 0 visibles

TAREA	ENTREGA		PESO	ESTADO	CLIENTE VE
GENERAL					
Gráfica campaña BC	30/10/2025		1.0	Completado	oculto
Nuevo Concepto Creativo BC	18/12/2025		1.0	Completado	oculto
Claquetas Nueva gráfica. BC	04/02/2026		1.0	Completado	oculto
Buyer Persona Narcisa Club BC	12/03/2026		1.0	Completado	oculto
Editables KV - Campaña Narcisa BC	18/03/2026		1.0	Completado	oculto
Acciones de Campaña BC	09/04/2026		1.0	Priorizado	oculto

Vista cliente (preview real del portal)

Campaña Creativa

Geeks · Entrega 9 de abril de 2026

0%

Avance del proyecto

HITOS

Sin hitos visibles todavía.

Detalle de un proyecto: avance ponderado, vista interna por bloque y la vista exacta del cliente.

Proyectos importados de Basecamp

Los que se trajeron con "Importar Basecamp" no nacieron de una plantilla, así que no se pueden repetir cada mes directamente. Para el fee de un cliente importado, crea el próximo mes una vez desde el Builder con "Repetir cada mes" y de ahí en adelante sale solo.

Crear un proyecto: el Builder en 5 pasos

Botón **+ Nuevo proyecto**. Si dejaste uno a medias, te ofrece continuar o descartar. Si hay cotizaciones aprobadas en PrometIO, aparecen arriba como borradores listos para usar.

- 1 Tipo de trabajo.** Elige la plantilla. Están agrupadas por pilar (Marca, Crecimiento, Transformación, Transversal) y familia, con precio de referencia. Hay plantillas generales y plantillas de un cliente.
- 2 Brief.**
- 3 Brief.** Cliente, nombre, objetivo de negocio, público, canales, mandatorios de marca, fecha de entrega final, presupuesto, cotización. Con ✨ **Pegar correo del cliente** pegas el pedido tal cual llegó y la IA llena el brief, sugiere plantilla, cuenta las piezas y lista las dudas que hay que preguntar antes de arrancar. El texto pegado no se guarda.
- 4 Alcance.** Desmarca bloques opcionales (su peso se redistribuye). En cada bloque indica el responsable y cuántas piezas de cada tipo: **post estático**, **carrusel** o **reel**. Cada tipo se expande en un to-do por paso de su flujo (un reel: ideas → guion → aprobación → storyboard → grabación → edición → aprobación → posteo). Un lote por paso para fees; una tarea por pieza para campañas.
- 5 Equipo y fechas.** Responsables por bloque y ajuste de fechas. El sistema avisa si una persona queda sobrecargada.
- 6 Revisión.** Ves la lista completa de tareas con fechas y pesos, y la **pantalla exacta del cliente**. Si es un fee, marca **Repetir cada mes**. Al crear: se guardan las tareas, se crea la lista y los grupos en Basecamp (máximo 50 to-dos por operación), se avisa por correo a los responsables.

Paso 1: elegir la plantilla por pilar y familia. Arriba, las cotizaciones aprobadas en PrometIO listas para usar.

BackIO

Dashboard
Backlog
Proyectos
Daily
Weekly
Huérfanos
Informes
ADMIN
Clientes
Mesas
Plantillas
Recurrencias
Tipos de pieza
Usuarios
Integraciones
API keys
+ Nuevo proyecto
Importar CSV

Nuevoproyecto

1 Tipo de trabajo
2 Brief
3 Alcance
4 Equipo y fechas
5 Revisión

Hay 1 cotización ganada en PrometIO esperando convertirse en proyecto.
Ver cotizaciones

Brief estructurado: formulario, no texto libre. Se guarda versionado en el proyecto.

CLIENTE *

Banco Amazon

NOMBRE DEL PROYECTO *

Programa de contenido - Octubre 2026

OBJETIVO DE NEGOCIO *

Sostener presencia en redes con contenido mensual de producto y educación financiera.

PÚBLICO OBJETIVO *

Clientes actuales y potenciales del banco, 25 a 45 años, usuarios digitales.

CANALES *

Instagram
Facebook
TikTok
LinkedIn
YouTube
Mailing
Web
POP / Retail
Medios
Otro

MANDATORIOS DE MARCA

FECHA DE ENTREGA FINAL *

2026-10-31

PRESUPUESTO APROBADO (USD)

COTIZACIÓN PROMETIO (UUID)

Opcional

Volver

Continuar

Paso 2: brief estructurado, con «Pegar correo del cliente» para que la IA lo llene.

BackIO

Dashboard
Backlog
Proyectos
Daily
Weekly
Huérfanos
Informes
ADMIN
Clientes
Mesas
Plantillas
Recurrencias
Tipos de pieza
Usuarios
Integraciones
API keys
+ Nuevo proyecto
Importar CSV

Nuevoproyecto

1 Tipo de trabajo
2 Brief
3 Alcance
4 Equipo y fechas
5 Revisión

Hay 1 cotización ganada en PrometIO esperando convertirse en proyecto.
Ver cotizaciones

Desmarca bloques opcionales; su peso se redistribuye proporcionalmente. En cada bloque indica cuántas piezas de cada tipo: cada tipo se expande en un todo por peso de su flujo (un reel: ideas → guiones → aprobación → storyboards → grabación → edición → aprobación → posteo). El peso se reparte por esfuerzo x cantidad.

Planificación

20% del proyecto (base 20%)

Calendario de contenidos

Aprobación de calendario

PIEZAS DE ESTE BLOQUE

Post estático

0

Carrusel

0

Reel

0

Instagram

0

piezas

Producción

55% del proyecto (base 55%)

Revisión de DA del mes

PIEZAS DE ESTE BLOQUE

Post estático

0

Carrusel

0

Reel

0

Instagram

0

piezas

Comunidad

15% del proyecto (base 15%)

Gestión de comunidad y respuestas

Cobertura de CM en evento

PIEZAS DE ESTE BLOQUE

Post estático

0

Carrusel

0

Reel

0

Instagram

0

piezas

Reporte

10% del proyecto (base 10%)

Reporte mensual

PIEZAS DE ESTE BLOQUE

Post estático

0

Carrusel

0

Reel

0

Instagram

0

piezas

Paso 3: bloques, responsables y piezas por tipo (post, carrusel, reel).

BackIO
Geekie Ecuador

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

luis.natafina@geekie.ec Salir

Nuevoproyecto

1 Tipo de trabajo2 Brief3 Alcance4 Equipo y fechas5 **Revisión**

Hay 1 cotización ganada en PrometIO esperando convertirse en proyecto.

Ver cotizaciones

☐ Repetir cada mes

Es un fee. BackIO creará el proyecto del mes siguiente el día 25 con esta misma configuración (bloques, piezas, responsables), lo enviará a Basecamp y avisará a la ejecutiva. El nombre seguirá el patrón «Cronograma de contenido - {mes} {año}». Se pausa o ajusta en Admin → Recurrencias.

Vista interna · 6 tareas · 3 visibles

TAREA	OWNER	ENTREGA	PESO
Planificación · Calendario de contenidos	—	03/10/2026	13.3
Planificación · Aprobación de calendario	—	06/10/2026	6.7
Producción · Revisión de DA del mes	—	21/10/2026	55.0
Comunidad · Gestión de comunidad y respuestas	—	31/10/2026	10.0
Comunidad · Cobertura de CM en evento	—	24/10/2026	5.0
Reporte · Reporte mensual	—	31/10/2026	10.0

Vista cliente · preview exacto del portal

Cronograma de contenido - Octubre 2026

Geeks · Entrega 31 de octubre de 2026

Avance del proyecto

0%

HITOS

Calendario de contenidos

Por iniciar

Aprobación de calendario

Por iniciar

Reporte mensual

Por iniciar

Si algo no debe estar aquí, se corrige en la plantilla antes de crear, no después.

Volver

Crear proyecto

Paso 5: revisión con la vista exacta del cliente y la casilla «Repetir cada mes» para fees.

Pesos y avance

El peso de cada tarea sale de la plantilla y del esfuerzo del tipo de pieza (post 1, carrusel 1.5, reel 4) multiplicado por la cantidad. El avance del proyecto y del portal es ponderado por ese peso, no por número de tareas.

Fees mensuales: recurrencia automática

Un fee se configura **una sola vez**. Después, BackIO crea el mes siguiente solo.

- 1 Crea el mes actual en el Builder y marca **Repetir cada mes** en el paso 5 (o pulsa **Repetir cada mes** en un proyecto que nació de plantilla).
- 2 Cada día a las 08:05, BackIO revisa las recurrencias activas. Si ya es el **día 25** (configurable de 1 a 28) y el mes siguiente no existe, lo crea con la misma configuración: bloques, piezas, responsables, ejecutiva.
- 3 El proyecto nuevo lleva el nombre del patrón de la plantilla (por ejemplo "Cronograma de contenido - Noviembre 2026"), inicio el día 1, entrega el último día del mes, sus tareas repartidas según la plantilla, la estructura en Basecamp y el correo a la ejecutiva y a operaciones para que lo revisen antes de que arranque el mes.

Recurrencias

Fees mensuales que BackIO genera solos. Cada día (08:05) revisa las activas: si ya llegó su día de generación y el mes siguiente no existe, crea el proyecto con la configuración guardada, lo envía a Basecamp y avisa a la ejecutiva. Se crean desde el Builder («Repetir cada mes») o desde un proyecto («Repetir cada mes»).

CLIENTE	PLANTILLA	PATRÓN DE NOMBRE	EJECUTIVA	DÍA	ÚLTIMO MES	PRÓXIMO	ACTIVA
Sin recurrencias. Marca «Repetir cada mes» al crear un fee en el Builder, o «Repetir cada mes» en un proyecto existente.							

Nombre del periodo: el patrón admite (mes) y (año). Fechas: inicio el día 1, entrega el último día del mes; las tareas se reparten según los offsets de la plantilla. Si el cliente no tiene proyecto en Basecamp, el proyecto se crea igual y queda marcado para reintentar.


Admin → Recurrencias: fees automáticos, día de generación, último mes y «Generar ahora».

En **Admin** → **Recurrencias** se ve cada una: cliente, plantilla, patrón de nombre (editable), ejecutiva, día, último mes generado con enlace, próximo periodo y si está pendiente. Se puede pausar, cambiar el día y **Generar ahora** sin esperar al 25. Un periodo nunca se genera dos veces.

Daily: apertura y cierre de mesa

El daily no prioriza: desbloquea. Una sola pantalla, sin scroll, con tres columnas:

- **Vence hoy o mañana sin iniciar:** priorizado y con fecha inminente.
- **Bloqueos nuevos (24 h):** pasaron a bloqueado desde ayer.
- **Fechas cambiadas desde ayer:** reprogramaciones recientes.

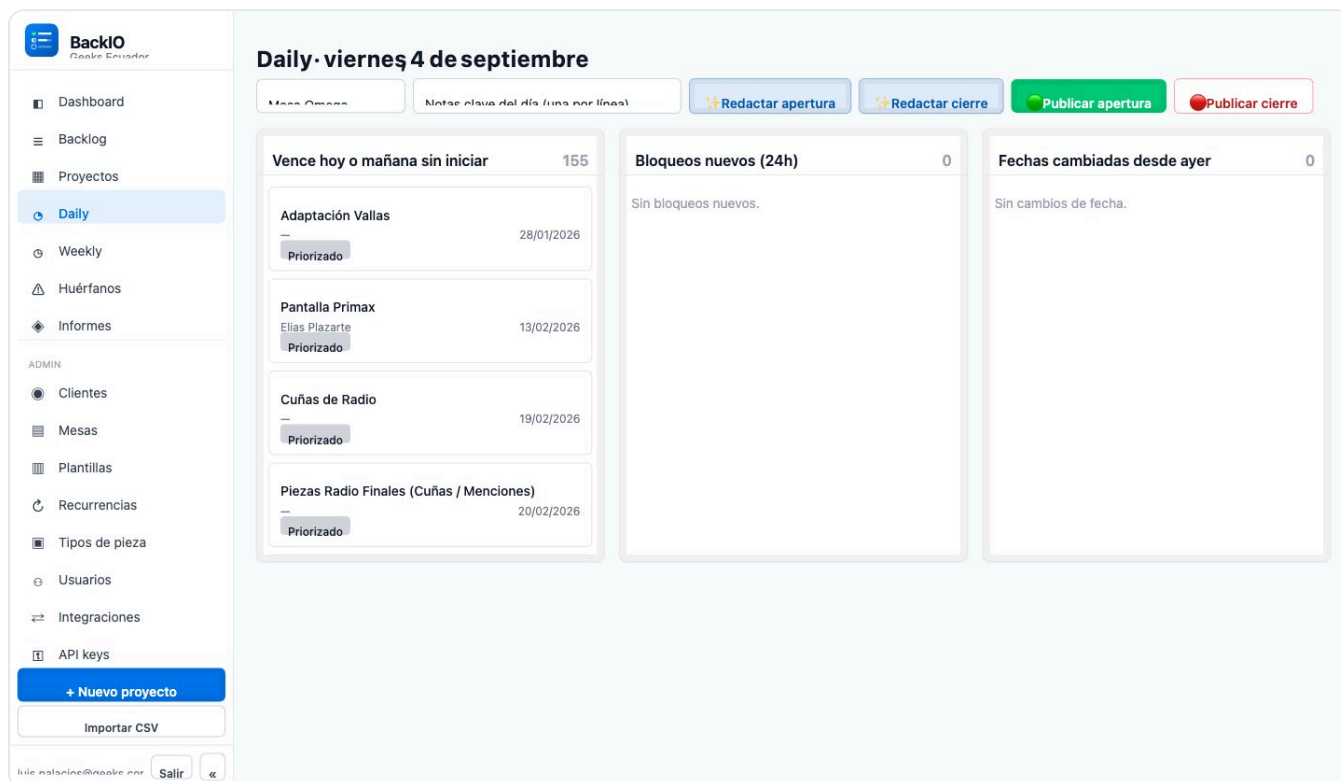

Daily: las tres columnas del día y los controles para redactar y publicar apertura o cierre.


Publicar en Basecamp

- 1 Elige la mesa y escribe las notas clave del día (una por línea).
- 2 Opcional: ✨ **Redactar apertura** o ✨ **Redactar cierre**. La IA escribe de 3 a 6 líneas con las señales del día; el texto aparece en un cuadro para editarlo.
- 3 **Publicar apertura** o **Publicar cierre**. Mientras trabaja ves "Publicando..." y al terminar una franja verde con el resumen y el botón **Ver en Basecamp** ↗.

El mensaje llega al board Daily de la mesa con el formato de siempre (responsable, hora, notas, vence, bloqueos, cambios). Cada tarea sale con el cliente en negrita, el **título enlazado al to-do**, el responsable, la fecha y los días de atraso en rojo. Si usaste la IA, se firma "Redactado por BackIO, publicado por [tu nombre]".

Weekly: señales, acuerdos, plan y acta

El weekly es de Marcia. La agenda no se escribe: la genera el motor de señales el domingo a las 18:00 (llega por correo) y se puede recalcular en cualquier momento con Recalcular señales.

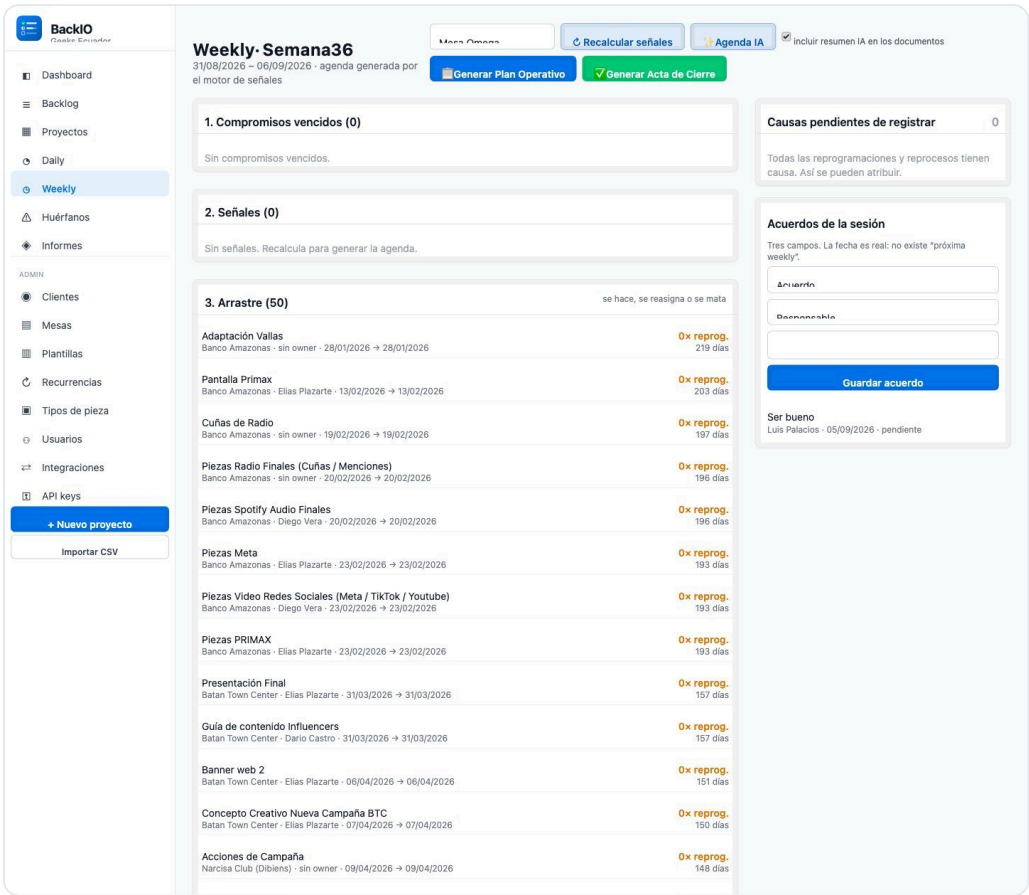

Weekly: compromisos, señales, arrastre, causas pendientes y acuerdos, con los botones de plan, acta y agenda IA.

Señales

Señal	Cuándo salta	Severidad	Tema de agenda
Compromiso vencido	Acuerdo del weekly con fecha pasada	Crítica	Rendición de cuentas
Arrastre reincidente	2 o más reprogramaciones	Crítica	Se hace, se reasigna o se mata
Reproceso reincidente	2 o más reprocesos	Crítica	Revisar brief y control de calidad
Atraso crítico	Más de 30 días de atraso	Crítica	Decisión inmediata
Bloqueo por cliente	Más de 5 días esperando al cliente	Alta	Escalar con la ejecutiva
Sobrecarga proyectada / Concentración de carga	Una persona con más del 30 % de la semana o por encima de su capacidad	Alta	Redistribuir

Sin movimiento	Más de 14 días sin tocar	Media	Revivir o cerrar
Cuenta silenciosa	Cliente sin entregas ni actividad en 14 días	Media	Contacto proactivo
Reprogramación / reproceso sin causa	Cambio sin motivo registrado	Media	Completar la causa

Acuerdos

Cada acuerdo lleva descripción, responsable y **fecha de compromiso real** (mínimo mañana). Se cierran como cumplidos o cancelados. Los vencidos encabezan la siguiente agenda.

Documentos

Elige la mesa.  **Generar Plan Operativo** (lunes: pendientes anteriores, capacidad, prioridades, riesgos) y  **Generar Acta de Cierre** (viernes: resultado, arrastre, señales, acuerdos). Con la casilla "incluir resumen IA" el documento arranca con un resumen ejecutivo y la agenda por causa. **Publicar en Basecamp** lo deja como mensaje en el board Weekly de la mesa con el título de siempre ("dd/mm/aaaa || Status Semanal Operativo - Semana N").

✨ Agenda IA

Status semanal en prosa (qué se entregó, qué se arrastra y por qué, dónde está la presión) y la agenda agrupada por causa: dependencias del cliente, ejecución y arrastre, capacidad, relación con cuentas, calidad y reprocesos, compromisos. Cada grupo trae **una pregunta de decisión** concreta para resolver en la reunión.

Causas pendientes

Panel a la derecha con las reprogramaciones y reprocesos sin causa. Se completan con un desplegable, sin salir del weekly.

Huérfanos: tareas creadas fuera de BackIO

Cada 30 minutos BackIO revisa los proyectos Basecamp de los clientes importados y detecta to-dos que no pasaron por BackIO. Operaciones recibe un correo.

En la pantalla se ve cliente, título, quién lo creó, fecha y antigüedad, y arriba un resumen de cuántos huérfanos creó cada persona. Dos acciones: **Adoptar** (crea el requerimiento en BackIO enlazado al to-do, dentro del proyecto de su lista si existe) o **Ignorar**. Revisar Basecamp ahora fuerza la revisión.

BackIO

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

Huérfanos

To-dos creados a mano en Basecamp sin pasar por BackIO. La regla es cliente → ejecutiva → BackIO → Basecamp; esta lista debería tender a cero.

Revisar Basecamp ahora

Andrea Romero: 5Johanna Banchon: 5Ivan Gaibor: 2Juan Chancay: 1

CLIENTE	TO-DO	CREADO POR	VENCE	DETECTADO		
Narcisa Club (Dibiens)	Reporte Agosto RRSS - Narcisa Club Basecamp	Andrea Romero	07/09/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Narcisa Club (Dibiens)	Acciones de Campaña Basecamp	Juan Chancay	09/04/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Cronograma septiembre 2026 Basecamp	Andrea Romero	21/08/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Video Totem Tarjetas Basecamp	Johanna Banchon	28/08/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Actualización Plantillas Basecamp	Johanna Banchon	27/08/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Historia animada transferencias al exterior Basecamp	Andrea Romero	23/07/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Cronograma agosto 2026 Basecamp	Andrea Romero	24/07/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	HISTORIA 3 AON: CREA TU NEO CUENTA 100% DIGITAL Basecamp	Ivan Gaibor	—	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	DDAYS 2- post: DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN Basecamp	Ivan Gaibor	—	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Carrusel Regreso a Clases Sierra Basecamp	Johanna Banchon	26/08/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Reel Regreso a Clases Sierra Basecamp	Johanna Banchon	26/08/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Guiones reels BASA septiembre Basecamp	Andrea Romero	28/08/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar
Banco Amazonas	Cronograma Octubre Basecamp	Johanna Banchon	10/09/2026	hace 1 h	Adoptar	Ignorar

Adoptar crea el requerimiento en BackIO enlazado al to-do (en el proyecto de su lista si existe). Ignorar lo deja fuera del backlog. La revisión automática corre cada 30 minutos y avisa a operaciones por correo.

Huérfanos: to-dos creados a mano en Basecamp, con quién los creó y las acciones Adoptar o Ignorar.

Cómo leerlo

La lista debería tender a cero. Si una persona aparece repetidamente, la conversación no es con BackIO, es con el hábito: el trabajo entra por la ejecutiva.

Informes mensuales

Informe ejecutivo por mesa. El día 1 de cada mes a las 08:00, BackIO redacta el del mes anterior para cada mesa y avisa por correo. También se genera a mano: mesa, mes y [Generar informe](#).

BackIO

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Clientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

Informes mensuales

Informe ejecutivo por mesa: entregas, piezas, horas de Basecamp, cotizado vs. horas, señales y arrastre, con lectura y decisiones redactadas por la IA. Se genera solo el día 1 de cada mes; aquí lo revisas y lo publicas en el board Weekly de la mesa.

Mesa Omega

2026-08

Generar informe

INFORME	MESA	GENERADO	PUBLICADO
Informe mensual - Mesa Omega - Agosto de 2026	Mesa Omega	4/9/2026	borrador Ver
Informe mensual - Mesa Orión - Septiembre de 2026	Mesa Orión	4/9/2026	✓ 4/9/2026 Ver

Informes mensuales: mesa, mes, generar y publicar en Basecamp.

Contiene: entregas y piezas, porcentaje a tiempo sobre fecha original y sobre fecha vigente, reprogramaciones con la causa principal, reprocesos con horas, horas totales, abiertos y atrasados al cierre, señales críticas; la sección "Lectura del mes" y "Lo que hay que decidir" redactadas por la IA; y las tablas por cliente (incluido cotizado vs. horas, USD por hora) y por persona.

Se revisa en pantalla, se copia o se publica en el board Weekly de la mesa con **Publicar en Basecamp**. Queda guardado en la lista con su estado (borrador o publicado).

Portal del cliente

Cada proyecto tiene un enlace de portal (token largo) que se activa desde el detalle del proyecto. Opcionalmente, el cliente puede tener un **PIN** de hasta 6 dígitos (Admin → Clientes) que se pide al abrirlo.

Qué ve el cliente

- Solo los hitos marcados como visibles en la plantilla, con la **etiqueta para cliente** (o el título si no hay etiqueta).
- Avance renormalizado sobre lo visible, para que 100 % signifique "todo lo que le prometimos está entregado".
- Estados simplificados: pendiente, en proceso, completado. "Cancelado" se muestra como en proceso. Lo que espera de su lado aparece con naturalidad, sin tono de reclamo.
- Un resumen ejecutivo de tres párrafos redactado por la IA **únicamente** con esos datos visibles.

Nunca ve: títulos internos, responsables, pesos, prioridades, comentarios, ni nada de Basecamp. La misma función que filtra el portal es la que genera la "vista cliente" del detalle del proyecto y del paso 5 del Builder, así que lo que ves ahí es lo que verá el cliente.

Basecamp: qué entra, qué sale, qué nunca

Dirección	Qué	Cuándo
BackIO → Basecamp	Lista por proyecto, grupo por bloque, to-do por requerimiento (título, fecha, asignados, "avisar al completar" a la ejecutiva), cambios de fecha, reapertura por reproceso, mensajes de daily, weekly e informe	Al crear el proyecto, al reprogramar, al registrar reproceso, al publicar
Basecamp → BackIO	Completado sí/no y cuándo, fecha, asignados; horas del timesheet (número, fecha, persona); títulos de to-dos al importar o detectar huérfanos	Webhook en segundos; reconciliación cada 30 min; horas cada 6 h
Nunca	Comentarios, descripciones, adjuntos, texto de las entradas de timesheet	—

Clientes
Vienen de PrometIO con el mismo id. Aquí solo se configura lo que PrometIO no conoce: proyecto de Basecamp, branding del portal y PIN.

Cliente	Basecamp Project ID	Logo URL	COLOR	PIN PORTAL	Acciones
Acme EC S.A.S	a6a7751-8146-4183-85b4-88e1c45deac7	https://media	#d59439	nnnn	Guardar, Webhook activo, Importar Basecamp, Diag
Banco Amazonas	96a17c9d-88b2-49d1-83f3-1cdd7419461d	https://banca	#af1818	nnnn	Guardar, Webhook activo, Reimportar, Diag
Batan Town Center	a628cd6b-07ae-42e9-8d81-dc569754544a	https://banca	#9b7117	nnnn	Guardar, Webhook activo, Importar Basecamp, Diag
Cervecería Nacional	15086c9e-46b6-434a-89ac-f2ff6ea8c65	https://media.linda.com	#0073ea	nnnn	Guardar
Dermage	0c873348-3cc5-44d3-b74e-04899d0286d1	https://mirc	#ffcf4d	nnnn	Guardar, Webhook activo, Importar Basecamp, Diag
Foligain	f99b0d84-c3f6-4bb9-b324-18ea7ee633e3	https://folia	#523d19	nnnn	Guardar, Webhook activo, Importar Basecamp, Diag
Grupo Torres & Torres	11e57283-df6e-4ac7-8da9-7e6c1da844c5	https://banca	#75b8ff	nnnn	Guardar, Webhook activo, Importar Basecamp, Diag
KKA - CN	4a018a3d-9f81-4514-8ff2-a9451962a643		#bd7df2	nnnn	Guardar, Webhook activo, Reimportar, Diag
Narcisca Club (Dibiens)	13131f9e-e92a-4857-a898-83948885b332	https://banca	#58ee69	nnnn	Guardar, Webhook activo, Reimportar, Diag

Admin → Clientes: mesa, Basecamp project id, PIN del portal, Webhook e Importar Basecamp.

Poner en marcha un cliente que ya trabaja en Basecamp

- Admin → Clientes: escribe el **Basecamp project id** (el número en la URL del proyecto) y guarda.
- Pulsa **Webhook** para que Basecamp avise en tiempo real.
- Pulsa **Importar Basecamp**: cada lista se vuelve un proyecto y cada to-do un requerimiento (oculto al cliente). Los completados de más de 60 días se omiten. Se puede repetir: solo trae lo nuevo y completa responsables.

- 4 Admin → Usuarios → ⇌ **Vincular con Basecamp** para que cada persona quede enlazada por correo. Sin esto, las tareas importadas salen "sin asignar".
- 5 Asigna el cliente a su mesa.

Tareas importadas con fechas viejas

Las fechas son las reales de Basecamp. Si están vencidas, hay que reprogramarlas (con motivo) o completarlas en Basecamp; no se "limpian" solas.

PrometIO: de la cotización al proyecto

- 1 En PrometIO se crea la empresa y el contacto. Al guardarla, aparece como cliente en BackIO con el mismo identificador. Si se edita el nombre o el RUC, se actualiza.
- 2 Se aprueba la cotización. BackIO recibe el evento y crea un **borrador de proyecto** con cliente, número, valor, líneas cotizadas y una plantilla sugerida según los servicios. Marcia recibe un correo.
- 3 En el Builder, el borrador aparece arriba con **Usar**: precarga cliente, cotización, nombre, plantilla y las piezas por tipo según las líneas. La ejecutiva completa el brief y crea. El valor cotizado queda en el proyecto para el indicador cotizado vs. horas.

El estado de la conexión y el secreto compartido se ven en Admin → Integraciones. Los intentos rechazados quedan en auditoría.

La capa de IA: qué redacta y quién publica

Principio: **la IA redacta, nunca publica**. Siempre hay una persona que revisa y pulsa. Todo texto generado va firmado "Redactado por BackIO, publicado por [persona]". El modelo solo recibe datos estructurados de BackIO (títulos, estados, fechas, números); como el texto de Basecamp nunca entra a BackIO, no puede llegar al modelo.

Botón	Dónde	Qué hace
🌟 Redactar apertura / cierre	Daily	Mensaje de 3 a 6 líneas con las señales del día, editable antes de publicar
🌟 Agenda IA · casilla "incluir resumen IA"	Weekly	Status narrado y agenda por causa con una pregunta de decisión por grupo; antepuesto al plan y al acta si marcas la casilla
🌟 Pegar correo del cliente	Builder, paso 2	Convierte el pedido en brief estructurado, sugiere plantilla, cuenta piezas y lista dudas
✉ Recordatorio	Backlog, filas en espera del cliente	Borrador de correo amable para copiar y enviar desde tu correo. BackIO no escribe al cliente
🌟 Generar informe	Informes	Informe ejecutivo mensual por mesa
Resumen ejecutivo	Portal del cliente	Tres párrafos con datos visibles al cliente, en caché 6 horas

BackIO

Geekle Ecuador

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

luis.palacios@geekle.com

Salir

«

Integraciones

Solo administradores. Las credenciales se guardan en la configuración del tenant.

Basecamp

Ejecución de producción. BackIO solo lee completed, due_on y asignaciones. Nunca texto.

CuentaGeeks Ecuador (4186385)

Autorizado porluis.palacios@geekle.com.ec

Conectado3/9/2026, 8:56:47 p. m.

Token expira17/9/2026, 8:56:47 p. m. (se renueva solo)

ReautorizarDesconectar

MCP Server

Una sola capa para Claude, ChatGPT, Gemini y agentes futuros. Las escrituras exigen preview + confirmación.

Endpointhttps://backiobackend-production.up.railway.app/mcp

AuthAPI key (Authorization: Bearer bk_live_...) u OAuth desde el cliente MCP

OpenAPIhttps://backiobackend-production.up.railway.app/api/openapi.json (para Gemini y clientes REST)

Lectura: list_backlog · get_project_status · get_weekly_signals · get_capacity · get_client_health · search_requirements · list_clients_and_templates

Escritura: plan_project_from_template → confirm_plan · plan_requirement_update → confirm_plan · generate_weekly_plan · generate_closing_minutes · publish_document

1. Conectar Claude Code

claude mcp add --transport http backio https://backiobackend-production.up.railway.app

Crea la key en Admin → API keys. Con OAuth: agrega el conector con la URL del endpoint y autoriza con tu usuario de BackIO.

PrometIO

Webhooks entrantes en /api/v1/webhooks/prometio firmados con HMAC. Los clientes llegan por ahí con el mismo id.

Admin → Integraciones: estado de Basecamp, MCP Server con sus tools y PrometIO.

Si los botones ✨ no aparecen, la clave de IA no está configurada en el servidor. Cada generación queda registrada con fecha, tipo y consumo.

Administración

Mesas

Equipos de cuenta. Cada mesa maneja clientes y tiene su proyecto Basecamp con dos boards: Daily (apertura/cierre) y Weekly (status semanal). Ahí publica BackIO.

Mesa Omega ☒ activa

BASECAMP PROJECT ID (ACTAS) LIDER
#190A771 Elia Diazeta

COLOR BOARD DAILY (ID)
#a25ddc 85A2A510AA

BOARD WEEKLY (ID) **Detectar boards**
066019A778

CLIENTES (3)
Banco Amazonas quitar
Dermage quitar
Foligain quitar
+ Añadir cliente

Mesa Orión ☒ activa

BASECAMP PROJECT ID (ACTAS) LIDER
#190A771 Cesar Espino

COLOR BOARD DAILY (ID)
#0400eb 85A2A510AA

BOARD WEEKLY (ID) **Detectar boards**
066019A778

CLIENTES (2)
KKA - CN quitar
TRADE - CN quitar
+ Añadir cliente

NUEVA MESA BASECAMP PROJECT ID **Crear mesa**
Mesa Sigma

Un proyecto puede llevarlo a otra mesa distinta a la de su cliente: se cambia en el detalle del proyecto.

Admin → Mesas: proyecto Basecamp de la mesa, boards Daily y Weekly, líder y clientes.

Plantillas

Una por familia del catálogo, agrupadas por pilar. Bloques → grupos de Basecamp; tareas → to-dos. Los pesos de bloques suman 100; los días son antes de la entrega. Las cantidades de piezas (post, carrusel, reel) se piden en el Builder, no aquí.

+ Nueva plantilla

Buscar plantilla

MARCA 7

Diseño de Piezas ATL / Prensa
Por pieza

Empaque y Etiquetas
Por pieza

Fee mensual
Fee mensual - G mensual - inactiva

Gestión de Redes Sociales
Fee mensual - G mensual

Kit de Identidad de Marca
Proyecto

Piezas de Imagen Corporativa
Por pieza

Reportería y Escucha Activa RRSS

Elige una plantilla o crea una nueva.

Admin → Plantillas: catálogo por pilar con bloques, tareas, pesos y visibilidad.

BackIO

Backe Explorer

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

Usuarios

Al guardar una invitación se crea la cuenta y la persona recibe un correo para definir su contraseña. Entra con el rol indicado; un correo @geeks sin invitación entra como colaborador.

Vincular con Basecamp

NOMBRE	EMAIL	ROL	CAPACIDAD H/SEM	BASECAMP USER ID	ACTIVO
Andrea Romero	andrea.romero@geeks.com.ec	lider	AN	4938A157	☒
Dario Castro	dario.castro@geeks.com.ec	colaborador	AN	520A1650	☒
Diana Chalen	diana.chalen@geeks.com.ec	colaborador	AN	510A0536	☒
Diego Vera	diego.vera@geeks.com.ec	colaborador	AN	48A86589	☒
Elias Plazarte	elias.plazarte@geeks.com.ec	lider	AN	48105257	☒
Fernando Orozco	fernando.orozco@geeks.com.ec	colaborador	AN	520290A1	☒
Grace Franco	grace.franco@geeks.com.ec	colaborador	AN	511876A8	☒
Ivan Gaibor	ivan.gaibor@geeks.com.ec	colaborador	AN	522830A0	☒
Johanna Banchon	johanna.banchon@geeks.com.ec	colaborador	AN	nnnnnnnn	☒
Julio Lucio	julio.lucio@geeks.com.ec	lider	AN	52080412	☒
LuchoP	luispalacios.ec@gmail.com	colaborador	AN	nnnnnnnn	☒
Luis del Pozo	luis.pozo@geeks.com.ec	colaborador	AN	nnnnnnnn	☒
Luis Del Pozo	luis.delpozo@geeks.com.ec	colaborador	AN	4A518905	☒
Luis Palacios	luis.palacios@geeks.com.ec	admin	AN	230272A6	☒

Admin → Usuarios: invitaciones, rol, capacidad y vínculo con Basecamp.

Cientes

Nombre, mesa, Basecamp project id, logo, color, PIN del portal, activo. Botones: Webhook (registrar y ver entregas), Importar / Reimportar Basecamp.

Mesas

Orión y Omega: proyecto Basecamp de la mesa, boards Daily y Weekly (**Detectar boards** los encuentra solos), líder, color y lista de clientes.

Plantillas

Catálogo por pilar y familia: bloques, tareas con offset de días, rol sugerido, peso, etiqueta para cliente y visibilidad. Recurrente y patrón de nombre para fees. Plantillas de un cliente o generales.

Recurrencias

Fees mensuales automáticos: pausar, día de generación, patrón de nombre, ejecutiva, generar ahora (capítulo 11).

Tipos de pieza

Post estático (1), carrusel (1.5) y reel (4) con su flujo de pasos. El esfuerzo multiplica el peso.

Usuarios

Invitar, rol, capacidad semanal en horas, Basecamp user id (manual o con **Vincular con Basecamp**), activo, reenviar invitación.

Integraciones

Estado de Basecamp (conectar cuenta), MCP Server (URL, OAuth, lista de tools, OpenAPI para Gemini u otros) y PrometIO (webhook).

API keys

Claves para agentes y sistemas con perfiles: gerencial (lectura), ejecutiva, operaciones, prometio, cliente o personalizado. La clave se muestra una sola vez; se puede revocar.

Agentes: MCP y API

BackIO expone un servidor MCP en `/mcp` y una API REST documentada en `/api/openapi.json`. Un asistente (Claude, Gemini u otro) puede consultar el backlog, el estado de un proyecto, las señales, la capacidad, la salud de un cliente, las horas y el status semanal narrado.

Para escribir (crear un proyecto desde plantilla, actualizar un requerimiento, generar plan o acta, publicar) el agente recibe un **plan de cambios** con un identificador que vence en 15 minutos; solo se ejecuta si una persona confirma con ese identificador. Cambiar una fecha de entrega exige motivo, igual que en la pantalla.

BackIO

BackIO

Dashboard

Backlog

Proyectos

Daily

Weekly

Huérfanos

Informes

ADMIN

Cientes

Mesas

Plantillas

Recurrencias

Tipos de pieza

Usuarios

Integraciones

API keys

+ Nuevo proyecto

Importar CSV

APIkeys

Para agentes (Claude, ChatGPT, Gemini) y PrometIO. Se guardan hasheadas y se muestran una sola vez.

NOMBRE

Claude de Luis

PERFIL

general readbacklog readproyectos readseñales readcapacidad

Crear key

NOMBRE	PREFIJO	SCOPES	ÚLTIMO USO	ESTADO
sprint1-verificacion-temporal custom	bk_live_tmp...	admin	nunca	revocada
verificacion-dashboard-temporal gerencial	bk_live_tmp...	read:backlog, read:proyectos	nunca	revocada
mcp-smoke-temporal gerencial	bk_live_tmp...	read:backlog, read:proyectos, read:señales, read:capacidad	nunca	revocada
verificacion-temporal gerencial	bk_live_tmp...	read:proyectos, read:backlog	nunca	revocada
diag-webhook-temporal custom	bk_live_tmp...	admin	nunca	revocada
prueba-sandbox-temporal operaciones	bk_live_tmp...	read:backlog, read:proyectos, read:capacidad, write:proyectos, write:requerimientos	nunca	revocada

Admin → API keys: claves por perfil para agentes y sistemas.

Acceso con API key (Admin → API keys) o con OAuth desde el propio asistente (pantalla de consentimiento de BackIO). Una key con más de 20 escrituras en 5 minutos genera alerta.

Indicadores y definiciones

Término	Definición
Días sin movimiento	Días desde el último cambio sustantivo de la tarea (estado, fecha, responsable, título). La métrica más importante: detecta tableros muertos
Días de atraso	Días desde la fecha de entrega vigente, solo en tareas no completadas
Fecha original	La comprometida al crear la tarea. No cambia nunca
A tiempo (original)	Completada antes o el día de la fecha original. Es el dato real de tiempos de entrega
A tiempo (vigente)	Completada antes o el día de la última fecha acordada. Mide si se cumple lo replanificado
Desvío	Mediana de días entre la fecha original y la entrega real, solo en entregas tardías
Arrastre	Días entre la fecha original y la vigente, más los días de atraso actuales
Reprogramación del equipo	Cambio de fecha con motivo capacidad, error de estimación o reproceso
Reproceso	Entregable que vuelve al equipo. Se mide en cantidad, causa y horas
Bien a la primera	Entregas sin ningún reproceso
Avance ponderado	Suma de pesos completados sobre pesos totales, sin cancelados. En el portal se renormaliza sobre lo visible
Peso	Importancia relativa de la tarea. Viene de la plantilla y del esfuerzo del tipo de pieza por cantidad
Capacidad semanal	Horas por persona (Admin → Usuarios). Base de la señal de sobrecarga
USD por hora	Valor cotizado activo del cliente dividido por sus horas del periodo. Señal de rentabilidad relativa
Huérfano	To-do creado en Basecamp sin pasar por BackIO

Rutinas recomendadas por rol

Ejecutiva de cuenta · a diario

- Backlog filtrado por tus clientes: nada "sin movimiento" más de 7 días.
- Filas con ✉: mandar el recordatorio al cliente.
- Pedidos nuevos: Builder (o "+ Agregar requerimiento" si es suelto). Nunca directo en Basecamp.
- Borradores de PrometIO: convertirlos el mismo día.

Quien lleva la mesa · a diario

- 09:00 Daily: revisar las tres columnas, ✨ redactar, publicar apertura.
- 18:00 publicar cierre.
- Reprocesos del día: registrarlos con causa.

Colaborador · a diario

- Tus tareas al día en estado. Completar en Basecamp.
- Si no llegas a la fecha: reprogramar con motivo antes de que venza, no después.
- Horas en el timesheet de Basecamp.

Marcia · semanal

- Domingo llega la agenda por correo.
- Lunes: recalcular señales, ✨ Agenda IA, Plan Operativo con resumen, publicar. Completar causas pendientes.
- Viernes: Acta de Cierre, acuerdos con fecha real, publicar.
- Huérfanos en cero.

Marcia · mensual

- Día 1: revisar el informe de cada mesa y publicarlo.
- Día 25: confirmar que los fees del mes siguiente se generaron (Admin → Recurrencias) y revisar fechas y responsables.

Admin · cuando haga falta

- Nuevo cliente: mesa, Basecamp project id, webhook, importar.
- Nueva persona: invitar, capacidad, vincular con Basecamp.
- Nuevo servicio: plantilla.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa habitual	Qué hacer
"El enlace no es válido o venció" al definir contraseña	Invitación de más de 24 h	Admin → Usuarios → reenviar. La pantalla muestra el detalle del error si es otra cosa
No veo la sección Admin / no puedo generar en Weekly	Tu rol no lo permite	Mira tu rol al pie del panel. Pide el cambio a un admin
Un proyecto muestra 0 tareas y 0 %	Abierto en los segundos en que se importaba, o filtro activo	Recarga. Si persiste, revisa Solo activos y filtros
No puedo marcar "Completado"	La tarea tiene to-do en Basecamp	Complétala en Basecamp; BackIO se enterará en segundos
Tareas importadas "sin asignar"	Personas sin Basecamp user id al importar	Admin → Usuarios → Vincular con Basecamp; luego Reimportar en el cliente
Al publicar el daily no pasa nada	Versión antigua o error del board	Ahora siempre hay franja de progreso y resultado; si sale roja, lee el motivo (board Daily no configurado, mesa sin proyecto)
Proyecto con "△ sync Basecamp"	Basecamp falló al crear la lista (límite de 50, sin proyecto Basecamp)	Detalle del proyecto → Reintentar Basecamp
No aparecen los botones ✨	Clave de IA no configurada	Avisar a Luis
La cotización aprobada no llegó	Webhook de PrometIO rechazado (secreto) o empresa sin sincronizar	Admin → Integraciones y auditoría; editar y guardar la empresa en PrometIO vuelve a enviarla
El filtro de mesa no muestra nada	Los clientes no tienen mesa asignada	Admin → Clientes → mesa
